

Projektplan

Projektet omhandler udviklingen af hjemmesiden StudyHub, som er en studieplatform målrettet studerende. Formålet med hjemmesiden er at samle studiehjælp ét sted gennem noter, studieguides, AI-tips, hjælp til kildesøgning og en chatfunktion med tutor. Projektet udvikles som en hjemmeside ved brug af HTML, CSS og Javascript med fokus på designproces, samarbejde og versionsstyring via Git og GitHub.

Konkret arbejdsfordeling:

Gruppen har fordelt arbejdet, så begge medlemmer kan arbejde parallelt på projektet.

Sabriin	Maya
HTML Sider	
• index.html • contact.html • about.html • sources.html	• AI-tips.html • notes.html • guides.html • chat.html
CSS	
Hovedansvar: • layout.css • style.css	Tester
Javascript	
Tester og integrerer	Hovedansvar • søgefunktion • chatfunktion
Dokumentation	
• Projektbeskrivelse (Sabriin) • README (Maya) • Projektstyring (Maya)	

- Roadmap (Maya)
- Procesbeskrivelse (Maya)
- Projektplan (Begge)
- Evaluering (Begge)
- UML (Begge)

Styringsværktøj:

Gruppen benyttede sig af Kanban styringsværktøj i GitHub til at skabe overblik over projektets arbejdsprocesser og opgaver. Der blev startet med at oprette en backlog, hvor alle opgaver blev tilføjet og fordelt mellem gruppemedlemmerne gennem rollefordeling. Efterhånden som der blev arbejdet med opgaverne, blev de flyttet mellem de forskellige kategorier i Kanban-boardet, eksempelvis “In Process”, “Review”, “Done”. Dette gjorde det muligt arbejde sideløbende, løbende at følge projektets udvikling og sikre struktur i samarbejdet.’

Kanban blev valgt som styringsværktøj, da det gav et simpelt og visuelt overblik over projektets opgaver og arbejdsfordeling. Kanban passede godt til projektet, fordi der arbejdes fleksibelt og parallelt med forskellige dele af hjemmesiden. Scrum blev fravalgt, da projektet er småt og ikke krævede faste sprint, daglige møder eller en mere omfattende projektstruktur.

Milepæle:

Milepæl 1: Projektstart og planlægning

- Opsætning af GitHub repository
- Projektstyring
- Udarbejdelse af roadmap
- Projektbeskrivelse
- Projektplan
- Oprettelse af mappestruktur i VS code

Formål:

At skabe struktur, arbejdsfordeling og fundamentet for projektet.

Milepæl 2: Design og struktur

- UML-diagrammer: Use case- og klassediagram

- Strukturering af hjemmesidens sider
- Planlægning af navigation og indhold

Formål:

At skabe overblik over hjemmesidens opbygning og brugerflow.

Milepæl 3: Udvikling af HTML-sider

- HTML front-end
- HTML funktionalitet
- AI-tips side
- Kildesøgningsside

Formål:

At udvikle hjemmesidens grundlæggende indhold og struktur

Milepæl 4: Styling og layout med CSS

- Udarbejdelse af CSS
- Layout og design
- Tilføjelse af bokse, header, footer og farvetema
- Logo

Formål:

At skabe et brugervenligt og visuelt sammenhængende design.

Milepæl 5: Interaktivitet med javascript

- Javascript funktionalitet
- Chatfunktion
- Inputfelter og interaktive elementer

Formål:

At gøre hjemmesiden mere dynamisk og interaktiv.

Milepæl 5: Test og kvalitetssikring

- Review og test af HTML
- Review og test af CSS
- Review og test af Javascript

Formål:

At identificere fejl og sikre funktionalitet samt ensartet design.

Milepæl 6: Dokumentation


- README
- Procesbeskrivelse
- Evaluering
- Færdiggørelse af projekt

Formål:

At dokumentere projektet og aflevere

Roadmap:

For at visualisere processen og tidsstyre projektet, er der anvendt et roadmap i GitHub med start- og sluttidspunkter for hver opgave.

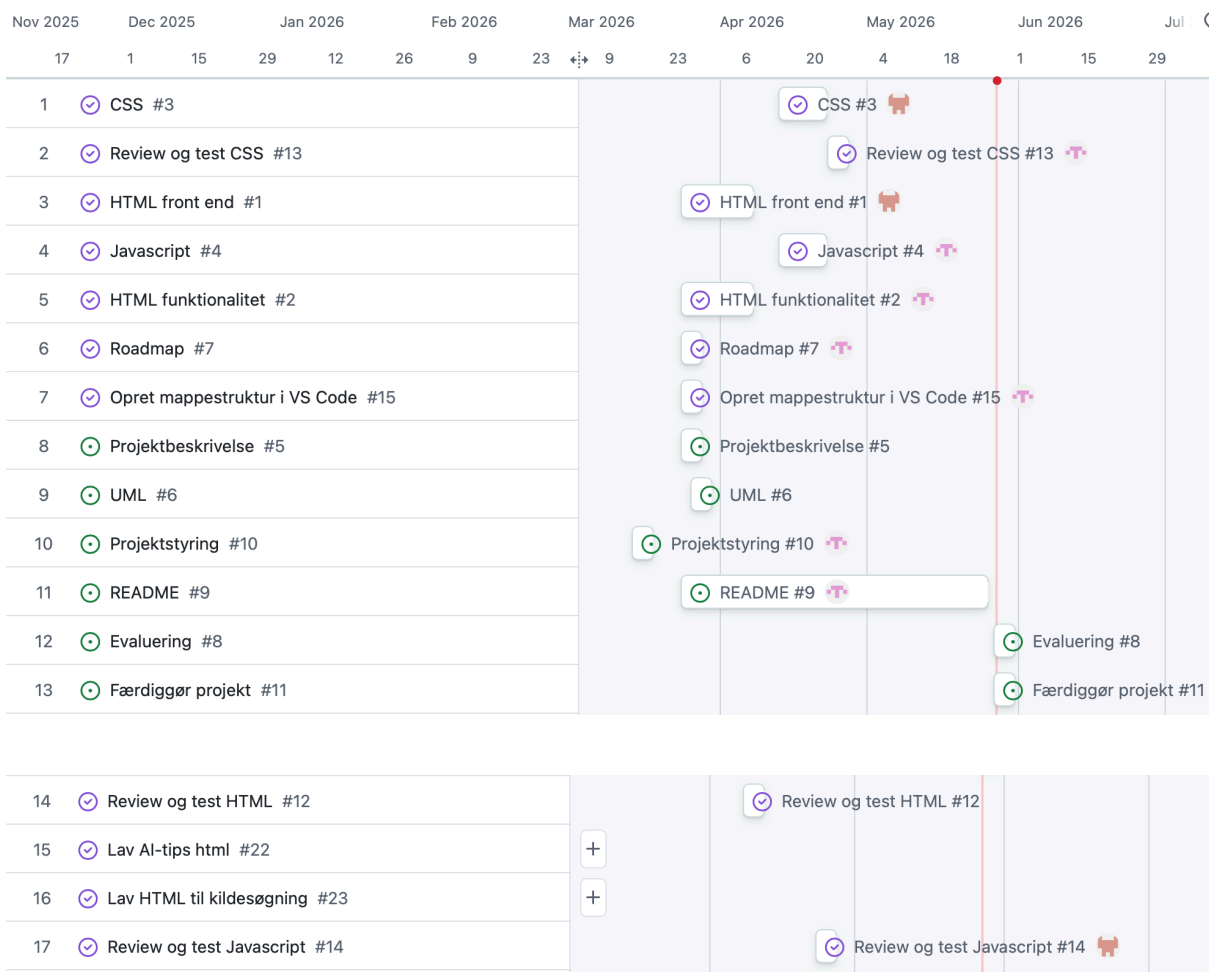

Evaluering (Retrospective)

Projektforløbet har været godt og vi har fået en velfungerende hjemmeside ud af det med de ønskede sider og funktioner. Det har været et bevidst valg at undlade at have en backend, da det ville være for komplekst på det tekniske niveau. Vi har derfor prioriteret at fokusere på frontend, der illustrerer hjemmesidens formål og muligheder.

Det har været positivt for processen at lave en klar rolle- og arbejdsfordeling, Kanban oversigt samt roadmap, da det muliggjorde at arbejde parallelt med hinanden og nå vores mål inden for den aftalte tidsramme. Kanban oversigten gav et godt overblik over opgaverne, deres status og projektets fremgang. Det var vigtigt for processen, at vi havde en klar tidsramme for de forskellige milepæle og overholdt disse aftaler, så vi altid kunne review hinandens arbejde, før vi gik videre til næste skridt i processen. Derfor har kommunikation været vigtig for os, så vi altid kunne holde os opdateret på, hvor vi hver især var nået til i processen.

Det var også spændende at arbejde med nye programmer og især med versionsstyring i GitHub, og de individuelle branches fungerede godt for at arbejde sideløbende uden fare for at skabe konflikt eller overskrive hinandens arbejde. Det har været givende for os at få indblik i forskellige metoder til samarbejde og have en arbejdsproces, der fokuserer på processen og samarbejdet frem for programmeringen i sig selv. Derudover har det været en positiv oplevelse at få lidt grundlæggende erfaring med projektledelse gennem planlægning, rollefordeling og valg af styringsværktøjer (Kanban). Vi har derfor fået en bedre forståelse for, hvordan et udviklingsprojekt kan styres i praksis og hvor vigtig kommunikation og koordinering er for et godt samarbejde.

En udfordring vi oplevede i projektet var at få integreret de forskellige HTML-filer, så navigationen på hjemmesiden var ensartet hele vejen igennem og for at kunne merge dem i vores main branch uden konflikter. Måden vi sørgede for at mindske disse problematikker og løse dem på, var at holde løbende review dage, hvor vi gennemgik og testede hinandens kode. På den måde kunne vi sikre at alt fungerede som det skulle på tværs af filer samt styrke kvalitetssikringen i projektet.

Vores projekt kunne have været endnu skarpere, hvis vi havde brugt mere tid på at udarbejde projektbeskrivelsen og vores UML designs, da disse i stor grad er med til at navigere processen og udarbejdelsen af projektet. Her kunne vi have været mere intentionelle i struktureringen af vores kode, til- og fravalg samt projektmål, med henblik på det fremtidige design.
